

50600.032005/2023-13



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Mauro Carvalho Junior
Ofício nº 0023/2023/GSMCARVA Brasília, 10 de agosto de 2023.

Excelentíssimo Senhor
Fabricio de Oliveira Galvão
Diretor-Geral do DNIT
SAN Qd. 03 Lt A , Ed. Núcleo dos Transportes
CEP: 70.040-902 Brasília-DF

Assunto: Remanejamento de recursos orçamentários para conclusão do contorno rodoviário norte de Cuiabá/Várzea Grande - Rodoanel - BRs 070/163/364/MT

Senhor Diretor-Geral,

Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Senhoria, reiteramos informações a respeito do andamento das obras do primeiro lote de construção em pista dupla do **Convênio Termo de Compromisso - TC 0764/2011, SIAFI 673117, processo 506000032208/2011-68**, firmado entre o DNIT e a SINFRA/MT.

O empreendimento de pavimentação objeto do Convênio, foi dividido em dois Lotes de Construção que, conforme os projetos, perfazem uma extensão de pista duplicada em concreto de 52 quilômetros, sendo o **primeiro Lote com 21,5 Km** de extensão com início na BR-163/364/MT, próximo ao Trevo do Lagarto em Várzea Grande, terminando na MT-251, em Cuiabá, e o **segundo lote com 30,5 KM**, inicia na MT-251 e finaliza na BR- 163/364/MT, após o Distrito Industrial (croqui abaixo).¹

AB

ave


1

Mauro Carvalho Junior
Concl
Ani



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Mauro Carvalho Junior

BR-163/MT - CONTORNO NORTE DE CUIABÁ/VÁRZEA GRANDE (RODOANEL)

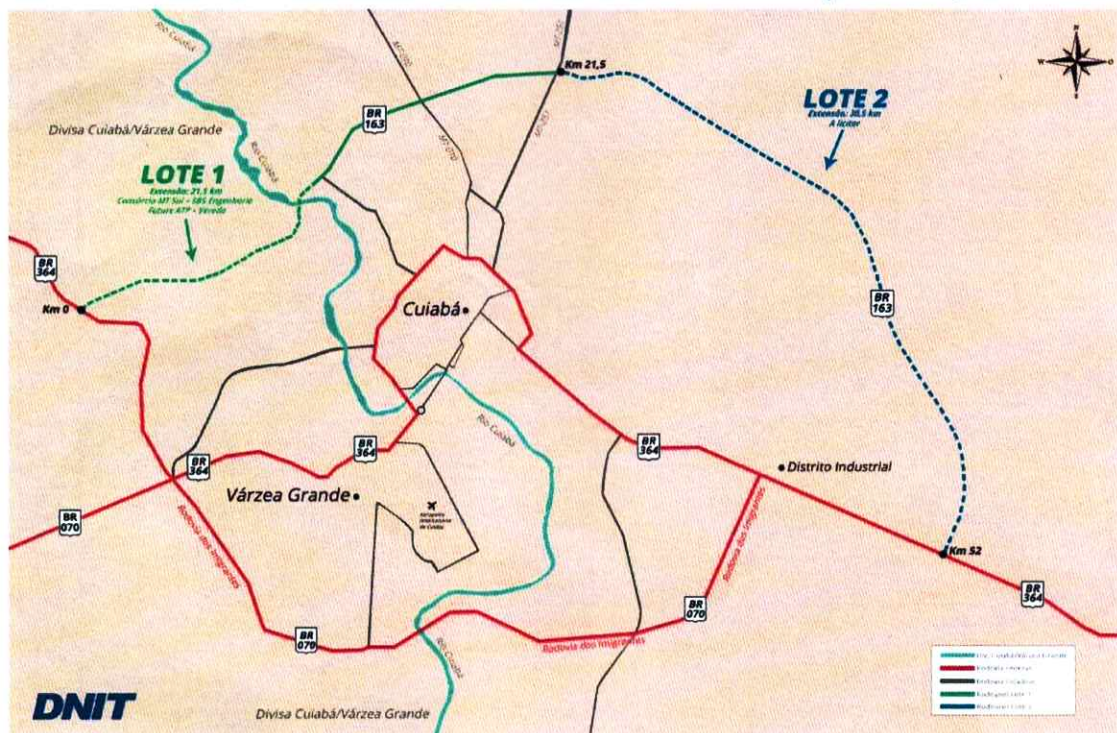

Tendo em vista a “janela orçamentária” da Secretaria de Orçamento Federal-SOF de remanejamento de recursos do OGU 2023 do DNIT, os parlamentares da Bancada do Mato Grosso, visando a priorização das obras de construção dos lotes 1 e 2 do Contorno Rodoviário Norte de Cuiabá, vem através deste apoiar o remanejamento de créditos para a funcional programática "26.782.3006.12KY.5314 - Construção do Contorno Rodoviário em Cuiabá - nas BRs 070/163/364/MT “.

A conclusão das obras do Contorno Rodoviário Norte de Cuiabá (Rodoanel) irá contribuir com a melhoria da logística no Estado do Mato Grosso, pois facilitará o escoamento da produção do agronegócio pelas rodovias federais BR-163/MT, BR-364/MT e BR- 070/MT e contribuirá para a solução do trânsito de veículos entre as cidades de Cuiabá e Várzea Grande.

Em anexo seguem documentos com informações financeiras, orçamentárias e técnicas relativas a situação atual do Convênio:

Leic
Abilio
2
[Assinaturas manuscritas]



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Mauro Carvalho Junior

O documento de fls. 1-2 (Convênio/Acordo) expõe o valor inicial do convênio de R\$ 323.582.183,87 aditada em 2020 para R\$ 539.303.639,80, sendo R\$ 215.721.455,93 (40%) de responsabilidade do Estado do Mato Grosso e R\$ 323.582.183,87 (60%) de repasse do Governo Federal. Do montante de responsabilidade do Governo Federal já foram liberados R\$ 73.000.000,00 e faltam repassar R\$ 250.582.183,87.

O documento de fls. 3 (Nota Informativa do DNIT) ratifica os dados e valores constantes de fls. 1-2 (Convênio/Acordo).

O documento de fls. 4-7 (Plano de Trabalho), elaborado pela SINFRA-MT, traz o cronograma de elaboração do projeto executivo de engenharia e execução das obras de implantação do Contorno Norte de Cuiabá/Várzea Grande, na Rodovia BR-163/364-MT – Lotes 1 e 2.

Expostos todos estes dados e fatos e certos de que a conclusão das obras do Contorno Rodoviário Norte de Cuiabá (Rodoanel) é também uma prioridade do Governo do Estado do Mato Grosso e do povo matogrossense, contamos com o valoroso empenho de Vossa Senhoria em viabilizar o remanejamento de recursos para conclusão dessa importante obra.

Cordialmente.

Senadora MARGARETH BUZETTI PSD/MT Coordenadora da Bancada do MT	
Senador MAURO CARVALHO UNIÃO/MT	
Senador JAIME CAMPOS UNIÃO/MT	
Deputado Federal ABÍLIO JÚNIOR PL/MT	
Deputada Federal AMÁLIA BARROS PL/MT	

Carlos Amador



SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Mauro Carvalho Junior

Deputado Federal CORONEL FERNANDA PL/MT	
Deputado Federal CORONEL ASSIS UNIÃO/MT	
Deputado Federal EMANUEL PINHEIRO NETO MDB/MT	
Deputada Federal GISELA SIMONA UNIÃO/MT	
Deputado Federal JOSÉ MEDEIROS PL/MT	
Deputada Federal FLAVINHA MDB/MT	

1- Dados do Convênio

ORIGEM DOS DADOS

Número do Instrumento (SIAFI/SICONV) 673117	Situação ADIMPLENTE	Nº Original 764/2011-00	Número do Processo 50600.032208/2011-68
---	-------------------------------	-----------------------------------	---

PORTAL DOS CONVÊNIOS

Objeto
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO (DUPLICAÇÃO), PROJETOS DE OBRAS E ARTES ESPECIAIS, PROJETO DE MEIO AMBIENTE (ESTUDOS AMBIENTAIS), PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO NORTE DE CUIABÁ/VARZEZA GRAND, NA RODOVIA FEDERAL BR-163/364/MT.

Tipo de Instrumento TERMO DE COMPROMISSO	Concedente DEPART NAC INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES	Órgão DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	<p>Fique de olho!</p> <p>O OBJETO DESSE CONVÊNIO FOI ENTREGUE?</p> <p><input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não</p> <p>O OBJETO DESSE CONVÊNIO É COMPATÍVEL COM O VALOR INVESTIDO?</p> <p><input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não</p> <p><input type="checkbox"/> Não sou um robô</p> <p style="text-align: center; color: #0070C0; font-weight: bold; background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 10px;">ENVIAR</p> <p style="font-size: small; color: #0070C0; text-align: center;">Se desejar registrar uma denúncia sobre o mau uso de recursos públicos, acesse o Fala.BR.</p>
--	--	--	--

Conveniente ESTÁDIO DE MATO GROSSO	Tipo de Conveniente ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL OU DO DISTRITO FEDERAL	Estado MATO GROSSO - MT	Município CUIABÁ
--	---	-----------------------------------	----------------------------

Início da Vigência 15/11/2012	Fim da Vigência 02/06/2027	Publicação 29/11/2012	
Valor do Convênio 323.582.183,87	Valor de Contrapartida 215.721.455,93	Valor Liberado 73.600.000,00 (22,56% DO VALOR DO CONVÊNIO)	

Observação: Na imagem acima, o Campo valor do convênio não se encontra atualizado, pois refere-se ao valor original o qual foi aditado na época da licitação de 2020.

O valor correto é **R\$ 539.303.639,80**, sendo

- 40% do valor de responsabilidade do Estado de Mato Grosso: R\$ 215.721.455,93
- 60% do Valor de responsabilidade do Governo Federal: R\$ 323.582.183,87

2- Valores Liberados

VALORES LIBERADOS - RELAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS			
DETALHAR	DATA	DOCUMENTO	VALOR R\$
3930033925220120B876687	28/12/2012	20120B876687	37.177.139,57
3930033925220120B872595	30/11/2012	20120B872595	35.822.660,43

Como esses valores foram liberados em 2012 e ficaram parados em conta vinculada ao Convênio, o saldo foi corrigido para R\$ 130.000.000,00 em decorrência dos rendimentos auferidos pela aplicação bancária.

Considerando o valor de responsabilidade do Governo Federal, subtraindo os valores já repassados, o conveniente tem a repassar o montante de R\$ 250.582.183,87

le

1

1

1

1

1

3- Valores disponíveis em 2023

O OGU/2023 possui dotação orçamentária de **R\$ 126.029.868,00**.

Desse valor, R\$ 25.205.974 já foram empenhados ao convênio, porém ainda não efetuada a transferência financeira.

Para a efetuação do terceiro repasse financeiro, o Estado deverá apresentar a prestação de contas da Primeira parcela repassada em 2012, no valor de R\$ 35.822.860,43 juntamente com o comprovante do depósito da contrapartida.

São as parcelas pendentes de repasse:

ANO	EXECUÇÃO	VALOR	A LIBERAR	LIBERADO
2022	março	R\$ 24.938.035,78	R\$ 24.938.035,78	R\$ 0,00
2023	março	R\$ 82.022.503,49	R\$ 82.022.503,49	R\$ 0,00
2024	março	R\$ 44.521.496,08	R\$ 44.521.496,08	R\$ 0,00
2025	março	R\$ 43.472.821,70	R\$ 43.472.821,70	R\$ 0,00
2026	março	R\$ 55.627.326,82	R\$ 55.627.326,82	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 250.582.183,87	R\$ 250.582.183,87	R\$ --

Os valores das parcelas pendentes podem ser alterados com uma simples reformulação do plano de trabalho a ser apresentado pela SINFRA/MT à Superintendência do DNIT em Mato Grosso.

4- Aumento do Valor do Convênio

O Governo do Estado deverá apresentar um novo orçamento do lote 02 a ser licitado na data-base atualizada, justificando assim o aumento do valor do empreendimento.

Para os aumentos decorrentes dos reajustamentos pagos durante a execução das obras, o DNIT já possui um procedimento específico, que deve ser tratado em momento adequado.

5- Anexos

- Plano de Trabalho do Convênio Atualizado
- Nota Informativa obtida junto a Coordenação Geral de Construção Rodoviária da DIR/DNIT

DNIT

NOTA INFORMATIVA

BR 163/364

TC: TC-764/2011-00 (673.117)

Proc. Base: 50600.032208/2011-68

Objeto: para a elaboração de projeto executivo de engenharia e execução das obras de implantação e pavimentação do contorno Norte de Cuiabá/Várzea Grande, na rodovia BR-163/364.

Assinatura: 15/11/2012 **Publicação:** 29/11/2012 **Vencimento:** 02-06-27.

Valor Inicial: R\$ 354.389.227,00, sendo R\$ 354.389.227,00 DNIT e R\$ 0,00 de Contrapartida (0%).

Valor Atual: R\$ 539.303.639,80 sendo R\$ 323.582.183,87 DNIT e R\$ 215.721.455,93 de Contrapartida (40%).

Total Concedente	Empenhado	A empenhar	Repassado	A Repassar
R\$ 323.582.183,87	R\$ 100.209.255,03	R\$ 223.372.958,84	R\$ 73.000.000,00	R\$ 250.582.183,87
Saldo de Empenho				
R\$ 27.209.225,03				

Parcelas ainda NÃO liberadas, conforme último Plano de Trabalho (5976048):

ANO	EXECUÇÃO	VALOR	A LIBERAR	LIBERADO
2022	março	R\$ 24.938.035,78	R\$ 24.938.035,78	R\$ 0,00
2023	março	R\$ 82.022.503,49	R\$ 82.022.503,49	R\$ 0,00
2024	março	R\$ 44.521.496,08	R\$ 44.521.496,08	R\$ 0,00
2025	março	R\$ 43.472.821,70	R\$ 43.472.821,70	R\$ 0,00
2026	março	R\$ 55.627.326,82	R\$ 55.627.326,82	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 250.582.183,87	R\$ 250.582.183,87	R\$ - -

SIAFI - 07/08/2023

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

SAN - Setor de Autarquias Norte - Quadra 3 - Lote A
Edifício Núcleo dos Transportes - Fone: (61) 3315-4000
CEP: 70.902-902 - Brasília/DF - www.dnit.gov.br

PLANO DE TRABALHO - 113				
1 • DADOS CADASTRAIS				
ORGÃO / ENTIDADE PROPONENTE SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA (SINFRA)			CNPJ 03.507.415/0022-79	
ENDEREÇO: Av. Dr. Hello Herminlo Ribeiro Torquato da Silva, SIN - Centro Político Administrativo. Ed. Ernandy Mauricio Baracat				
CIDADE CUIABA	UF MT	CEP 78.048-250	DDD/TELEFONE (65) 3613-0501	E.A. ESTADUAL
CONTA CORRENTE 1.042.521-7		BANCO Banco do Brasil	AGENCIA 3834-2	IPRÓPRIA DE PAGAMENTO CUIABA
NOME DO RESPONSÁVEL MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA				CPF 161.913.661-91
ICI / ORGÃO EXPEDIDOR 007317 SSP-MT	CARGO SECRETARIO	FUNÇÃO SECRETARIO DE ESTADO	MATRICULA -	
ENDEREÇO: Edifício Edgar Prado Ara - CPA				CEP 78.045-000
2 • OUTROS PARTICIPES				
NOME GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		CGC/CPF 03.507.415/0001-44	E.A. ESTADUAL	
ENDEREÇO: PALACIO PAIAGUENSIS - CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO				CEP 78050-970
NOME DO RESPONSÁVEL MAURO MENDES FERREIRA				CPF 304.362.301-00
ICI / ORGÃO EXPEDIDOR 1426803 SSP GO	CARGO GOVERNADOR	FUNÇÃO GOVERNADOR DO ESTADO	MATRICULA -	
3 - DESCRICAO DO PROJETO				
TÍTULO DO PROJETO: Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia e Execução das Obras de Implantação e pavimentação do Contorno Norte de Cuiabá - Zona Grande, na Rodovia BR-163/364/MT		PERÍODO DE EXECUÇÃO		
		INÍCIO nov-12	TERMINO fev-27	
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO O presente termo de convênio tem por objeto a Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia e Execução das Obras de Implantação e pavimentação do Contorno Norte de Cuiabá - Zona Grande, na Rodovia BR-163/364/MT, em dois Lotes.				
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO				
<p>○ Oitante do tempo necessário para licitação, contratação e execução, conforme cronogramas físico-financeiros incluídos no anteprojeto de engenharia, bem como prioridade de execução para o Lote 01, conforme solicitação do DNIT, se faz necessário um aditivo de prazo de 1.440 dias, uma vez que a revisão/elaboração/aprovação do Anteprojeto de Engenharia, aprovação do Termo de Referência e Minuta do Edital, consumiu o prazo de execução do Termo de Compromisso;</p> <p>○ Urge também, a necessidade de adequar os valores celebrados na época do Termo de Compromisso nº 764/2011, uma vez que os mesmos não condizem mais com a realidade e que houve alteração na solução técnica do pavimento.</p>				

Anexo Ofício nº 0023/2023/GSMCARVA

PLANO DE TRABALHO • 213

Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia e Execução das Obras de Implantação e Pavimentação do Contorno Norte de Culada W6rzea Grande na Rodovia BR-183/384/MT- LOTES 01 E 02

Rodovia: BR-183/384/MT

Trecho: Divisa MS/MT - Ovl11 MT/PA

Subtrecho: Entr. BR-070/183/364 - Entr BR-183/364 (Contorno Norte de Culada)

Segmento: km 0,0-km 51,71

Extensão: 51,71

Cód. PNV: 183BMT9010; 1838MT1020; 163BMT9030; 183BMT9040; 163BMT9050; 1838MT9080

4 - CRONOGRAMA DE EXECUCAO (META, ETAPA OU FASE)					
META, ETAPA ou FASE	ESPECIFICAÇÃO	INICIAÇÃO FÍSICO		DURAÇÃO	
		UNID.	QUANT.	INÍCIO	TERMINO
1	Melo Ambient* -Estudo Ambientais etc....)	km	51,71	01/03/2021	31/08/2023
2	Elaborac.ão de Laudos para Cosoamento	km	51,71	01/03/2021	31/08/2023
3	Projeto Execultvo de Engenharia	km	51,71	01/03/2021	31/08/2023
	Relat6rios Per6d6os			01/03/2021	31/08/2023
	Relat6rio Preliminar			01/03/2021	31/03/2023
	Relat6rio do Projeto Base			01/04/2021	31/05/2023
	Relat6rio Final do Projeto Execultvo - Minuta			01/08/2021	31/07/2023
	Relat6rio Final do Projeto Execultvo -Aprovaçao e Impresao Oofinitiva			01/08/2021	31/08/2023
4	Obras Rodov6rias	km	51,71		
	Servi - Preliminares			01/03/2021	28/02/2027
	Tenrapionagom			01/09/2021	30/11/2028
	Pavimenta o Pav. R6gido			01/10/2021	28/02/2027
	CAUJO - Enehimento dos acostamentos			01/09/2021	31/08/2023
	Pavimonto Semi-r6gido (Acetosol retomost oncontros e sobre OAEs)			01/09/2021	28/02/2027
	Obras de Arte Correntes			01/09/2021	30/11/2028
	Orenagom - Supf11elal - Profunda			01/09/2021	28/02/2027
	Prote o ao Melo Ambiente			01/05/2023	28/02/2027
	Obras Complomantares			01/03/2023	28/02/2027
	Sinalizaçao			01/05/2023	28/02/2027
	OAE 1 - Viadutos em conereto pre-moldado pretendido (BR-183/364)	CJ	1,00	01/09/2021	31/08/2023
	OAE 2 - Pontes am conereto pr6-moldado pretendido (Rio CulabA)	CJ	1,00	01/09/2021	31/08/2023
	OAE 3 - Passagem em desnival Av. Ant11r11ca e Tr1ncheira Sucur1 (lado direito e esquerdo)	CJ	1,00	01/09/2021	31/08/2023
	OAE 4 - Passagem em Desnival 1 (lado direito e esquerdo)	CJ	1,00	01/09/2021	31/08/2023
	OAE 5 - Viaduto em conereto pr6-moldado pretendido (MT-010)	CJ	1,00	01/09/2021	31/08/2023
	OAE 6 - Passagem em Desnival 2 (lado direito e esquerdo)	CJ	1,00	01/09/2021	31/08/2023
	OAE 7 - Viadutos em conereto pre-moldado pretendido MT-020/251 (lado direito e esquerdo)	CJ	1,00	01/09/2021	31/08/2023
	OAE 8 - Passagem em Desnival 3 Qado direito e esquerdo)	CJ	1,00	01/09/2023	31/12/2028
	OAE 9 - Passagem em Desnival 4 Qado direito e esquerdo)	CJ	1,00	01/09/2023	31/12/2028
	OAE 10 - Passagem em Desnival 5 (lado direito e esquerdo)	CJ	1,00	01/09/2023	31/12/2028
	OAE 11 - Pontes em conereto pre-moldado pretendido (Rio Coxp6)	CJ	1,00	01/09/2023	31/12/2028
	OAE 12 - Pontes em conereto pre-moldado pretendido (Rio Arte6 I)	CJ	1,00	01/09/2023	31/12/2028
	OAE 13 - Passagem em Desnival 6 Qado direito e esquerdo)	CJ	1,00	01/09/2023	31/12/2028
	OAE 14 - Pontes em conereto pr6-moldado pretendido (Rio Arte6 II)	CJ	1,00	01/09/2023	31/12/2028
	OAE 15 - Viaduto em conereto pre-moldado pretendido (BR-070/183/364)	CJ	1,00	01/09/2023	31/12/2028

5 - PLANO DE APLICACAO			
NATUREZA DE GASTO	TOTAL 1+2+3	Proponeni. 2	Concedenti 3
ESPECIFICAÇÃO			
PROJETO	RS 5.055.338,50	RS 2.022.134,80	RS 3.033.201,90
OBRAS + RISCO	RS 508.789.476,65	RS 203.515.790,66	RS 305.273.665,99
SUPERVIMO	RS 25.58.828,84	RS 10.183.530,66	RS 15.275.295,98
TOTAL GERAL	R\$ 539.303.639,79	R\$ 215.721.435,92	R\$ 323.582.183,87

Handwritten signatures and initials in blue ink:

- Large signature on the left: "N. J. de A." (partially visible)
- Signature in the center: "A. J. de A." (partially visible)
- Signature on the right: "M. J. de A." (partially visible)
- Initials "f)" and "N." are also present.

Anexo Ofício nº 0023/2023/GSMCARVA

PLANO DE TRABALHO 313

Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia e Execução de Obras de Implantação - pavimentação do Contorno Norte de Culab6N, rza Grande, na Rodovia BR-163/384/MT-LOTES 01 E 02
 Rod-Ma BR-1831364/MT
 Trecho: OMSa MS/MT- DMN MTIFA
 Subtrecho: Entr. BR-070/183/384 - Entr BR-1831364 (Contorno Norte de Culabi)
 Segmento: km 0,0- km 51,71
 Extensão: 51,71
 Cód PNV: 1638MT9010; 1638MT9020; 1638MT9030; 1638MT9040, 1638MT9050, 1638MT

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (RS)

CONCEOENTE							
META	1112	1212	01/13abi 12/13	01114*1-12114	01115*1-12115	01/16a1-12116	
I-2	R+ 35 822 860 43	RS 37 177,13957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
META	01117 " 00/17	07117 -1-12117	0111aa1* 00/18	07118a1c12/18	01119a1' 00/19	07119 " 12119	
I-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
META	01120 81' 03/20	04/20a1'oe/20	07/20 ate 09120	10120 " 2/20	01121 ate 03121	04/21 a16De/21	
I-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
META	07121	08/21	09121	10/21	11121	12121	
I-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
META	01122	02122	03122	04/22	05122	06/22	
I-2	0,00	0,00	24 938 035,78	0,00	0,00	0,00	0,00
META	07122	08122	09/22	10/22	11122	12122	
I-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
META	01/23	02123	03123	04/23	05123	06123	
I-2	0,00	0,00	82 022 503,49	0,00	0,00	0,00	0,00
META	07123	08/23	09123	10/23	11 23	12123	
I-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
META	01124	02124	03124	04/24	05124	06/24	
I-2	0,00	0,00	44 521 496,09	0,00	0,00	0,00	0,00
META	07124	09/24	09/24	10124	11124	12124	
I-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
META	01125	02125	03125	04/25	05125	06 25	
I-2	0,00	0,00	43 472,621,70	0,00	0,00	0,00	0,00
META	07125	08 25	09125	10/25	11125	12125	
I-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
META	01126	02126	03125	04/26	05126	08126	
I-2	0,00	0,00	55 627 326,82	0,00	0,00	0,00	0,00
META	07126	08/26	09128	10126	11128	12128	
I-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
META	01127	02127					
I-2	0,00	0,00					
TOTAL GERAL 00 CONCEOENTE							RS 323.562.183,67

7 - APROVAÇÃO PELO CONCEOENTE

PROPONENTE							
META	11/12	12112	01113 ate 12113	01114 a1' 12/14	01/16aMI 12/15	01/18 aKl 12/18	
I-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
META	01/17 ate 6 06/17	01117 ate 6 12117	01/18 " 00/18	07/18 aW12/18	01/19 ate 6 08110	07/19 ate 12/19	
I-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
META	01120 ... 03120	04/20 a1' 06/20	07120 ate 09120	10120 ate 12/20	01121 ate 6 03/21	04/21a1606121	
I-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
META	07121	08121	09121	10/21	11121	12121	
I-2	0,00	0,00	32 232 290,78	0,00	0,00	0,00	0,00
META	01122	02122	03/22	04/22	05122	09122	
I-2	0,00	0,00	16 529 866,54	0,00	0,00	0,00	0,00
META	07122	09/22	09122	10/22	11122	12122	
I-2	0,00	0,00	18 529 866 54	0,00	0,00	0,00	0,00
META	01123	02123	03 23	04/23	05123	oe/23	
I-2	0,00	0,00	35 460 209,02	0,00	0,00	0,00	0,00
META	07123	08123	09/23	10123	11123	12123	
I-2	0,00	0,00	19 221 459,97	0,00	0,00	0,00	0,00
META	01124	02124	03/24	04/24	05124	06/24	
I-2	0,00	0,00	15 821 109,64	0,00	0,00	0,00	0,00
META	07124	09/24	09/24	10/24	11124	12124	
I-2	0,00	0,00	13859 887,74	0,00	0,00	0,00	0,00
META	01125	02125	0312*	04/25	05125	06/25	
I-2	0,00	0,00	14 690 890,24	0,00	0,00	0,00	0,00
META	07125	08125	09125	10125	11125	12125	
I-2	0,00	0,00	14 090 990,90	0,00	0,00	0,00	0,00
META	01126	02126	03125	04/28	05126	oe/28	
I-2	0,00	0,00	10 574 446,59	0,00	0,00	0,00	0,00
META	07126	08126	09/26	10/26	11128	12126	
I-2	0,00	0,00	26 610 435,97	0,00	0,00	0,00	0,00
META	01127	02127					
I-2	0,00	0,00					
TOTAL GERAL 00 PAOPONF,NTIE							RS 281 721 461,00

7 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para os devidos fins, que a presente proposta é verdadeira e fielmente representa a realidade econômica e financeira da empresa, e que não há qualquer débito em mora ou alienação de inadimplência com o Tesouro Nacional Federal.

6J,oti o lot/oiio
 Localidade: _____ Proponente: _____
 MA III 8.cret

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEOENTE

Concedente: _____
 ENG. _____
 R11gionl do ONIT em Mato Grosso

11/10

Arício

6

de

Juana

Anexo Ofício nº 0023/2023/GSMCARVA

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CUSTOS				
Elabora ^o de Projeto Executivo de Engenharia e Execu ^o das Obras de Planta ^o e pavimenta ^o do Contorno Norte de Culab./Virzea Grande, n1Rodovia BR-163/MT- LOTE 01E 02				
C6d. PNV: 163BMT9010; 163BMT9020; 163BMT9030; 163BMT9040; 163BMT9050; 163BMT9060				
Trecho: Divisa MS/MT - Divisa MT/PA				
Subtrecho: Entr. BR-070/163/364 + Entr BR-163/364 (Contorno Norte de Culabi)				
Segmento: km 0,0 - km 51,71				
Extensio: 51,71				
C6d. PNV: 163BMT9010; 163BMT9020; 163BMT9030; 163BMT9040; 163BMT9050; 163BMT9060				
DESCRIB	CUSTDS			
	Quant.	Unid.	Custo Unitario	Custo Total
Projetos Executivos de Engenharia	51,71	km		R\$ 5.055.336,50
Obras Rodovias (Obras + Risco)				R\$ 508.789.476,65
Implantao e Pavimentao (Duplicao Pavimento Rigido)	51,71	km	R\$ 413.263.446,22	R\$ 413.263.446,22
DAE 1 - Vladutos em concreto pre-moldado protendido (BR-163/364)	1,00	CJ	R\$ 4.025.232,22	R\$ 4.025.232,22
DAE 2 - Pontes em concreto pre-moldado protendido (Rio Cuiaba)	1,00	CJ	R\$ 19.716.907,16	R\$ 19.716.907,16
DAE 3 - Passagem em desnvel Av. Antirica e Trinchelra Sucuri (lade direito e esquerdo)	1,00	CJ	R\$ 7.538.178,95	R\$ 7.538.178,95
DAE 4 - Passagem em Desnvel 1 (lado direito e esquerdo)	1,00	CJ	R\$ 2.089.408,78	R\$ 2.089.408,78
DAE 5 - Vladuto em concreto pre-moldado protendido (MT-010)	1,00	CJ	R\$ 13.261.690,38	R\$ 13.261.690,38
DAE 6 - Passagem em Desnvel 2 (lado direito e esquerdo)	1,00	CJ	R\$ 2.268.107,47	R\$ 2.268.107,47
DAE 7 - Vladutos em concreto pre-moldado protendido MT-020/251 (lade direito e esquerdo)	1,00	CJ	R\$ 3.877.410,25	R\$ 3.877.410,25
DAE 8 - Passagem em Oesnvel 3 (lade direito e esquerdo)	1,00	CJ	R\$ 2.580.910,91	R\$ 2.580.910,91
DAE 9 - Passagem em Oesnvel 4 (lado direito e esquerdo)	1,00	CJ	R\$ 2.409.785,07	R\$ 2.409.785,07
DAE 10 - Passagem em Oesnvel 5 (lado direito e esquerdo)	1,00	CJ	R\$ 2.448.934,05	R\$ 2.448.934,05
DAE 11 - Pontes em concreto pre-moldado protendido (Rio Coxip6)	1,00	CJ	R\$ 5.010.653,04	R\$ 5.010.653,04
DAE 12 - Pontes em concreto pre-moldado protendido (Rio Arica I)	1,00	CJ	R\$ 1.839.221,12	R\$ 1.839.221,12
DAE 13 - Passagem em Oesnvel 6 (lade direito e esquerdo)	1,00	CJ	R\$ 2.489.525,36	R\$ 2.489.525,36
DAE 14 - Pontes em concreto pre-moldado protendido (Rio Arica II)	1,00	CJ	R\$ 1.818.260,67	R\$ 1.818.260,67
DAE 15 - Vladuto em concreto pre-moldado protendido (BR-070/163/364)	1,00	CJ	R\$ 4.361.190,95	R\$ 4.361.190,95
Calculo do Risco (Lotes 01 e 02)			R\$ 19.790.614,05	R\$ 19.790.614,05
Supervtsio de Obras				R\$ 25.458.826,64
Custos Medics Gerenciais DNIT Uul/17):	4,65		R\$ 513.844.813,15	R\$ 23.893.783,81
Reajustamento (de Jul/17 para Jul/19):	0,0655			R\$ 1.565.042,83
VALOR TOTAL 00 TERMO DE CDMPRDMISSO				R\$ 539.303.639,79
Percentual do Concedente (Governo Federal+ DNIT)	60,00			R\$ 323.582.183,87
Percentual do Proponente (Estado de Mato Grosso+ SINFRA/MT)	40,00	II		R\$ 215.721.455,92

Arbico

Die

Mia

Lucas
